


工事名称	四国中央市 市民文化ホール新築工事	3 月 間 工 程 表	発注者	四国中央市 市長 篠原 実	所長	副所長	主任
工 期	平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日		施工者	株式会社 熊谷組 中四国支店	下川	西田	正法地
設 計 者	株式会社 あい設計		作成者	正法地	作成日	平成 29年 2月 20日	

項目	平成 29年																															備考		
	3月																																	
行事	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
検査・立会い					B-1打設前検査立会					B-2配筋検査立会	B-1生コン						B-3打設前検査立会								第10回総合定例会議									
提出書類・図面		1階客席部	客席部床	スリーブ図					1階土間下配筋図	1階床打込み配筋図	エレベーター図											客席部屋根鉄骨図												
仮設																	北90tカマ組立て																	
<b>B工区</b>																																		
B-1工区		基礎・地中梁型枠				基礎・地中梁コン				型枠解体						埋め戻し・砕石																		
B-2工区		基礎・地中梁配筋					基礎・地中梁型枠									基礎・地中梁コン																		
B-3工区		墨出し	基礎・ス					基礎・地中梁配筋																										
B工区電気・機械工事		通路・足場		B-2工区	スリーブ工事																													
<b>A工区</b>																																		
二重ビット		梁下筋・土間ビット配筋		土間ビットコン																														
A-1工区		止枠																																
A-2工区																																		
A工区電気・機械工事																																		
<b>C工区</b>																																		
C-1工区																																		
C-2工区		墨出し						基礎・ス・アンカーセット																										
C工区電気・機械工事																																		
<b>D工区基礎</b>																																		
D-1・2工区																																		

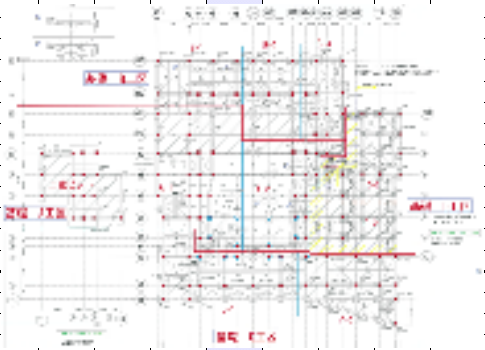

実施出来高 3.15  
 予定出来高 3.00

コンクリート打設実施線

工程進捗線
