


| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------------------|-----|----------------|-----|----------------|--|----|-----|-----|
| 工事名称 | 躯体 四国中央市 12月から最終 | 躯体工事 12月 月間工程表 | 発注者 | 四国中央市 市長 篠原 実 | | | | 所長 | 副所長 | 副所長 |
| 工期 | 平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日 | | 施工者 | 株式会社 熊谷組 中四国支店 | | | | 下川 | 西田 | 正法地 |
| 設計者 | 株式会社 あい設計 | | 作成者 | 正法地 | 作成日 | 平成 29年 11月 17日 | | | | |

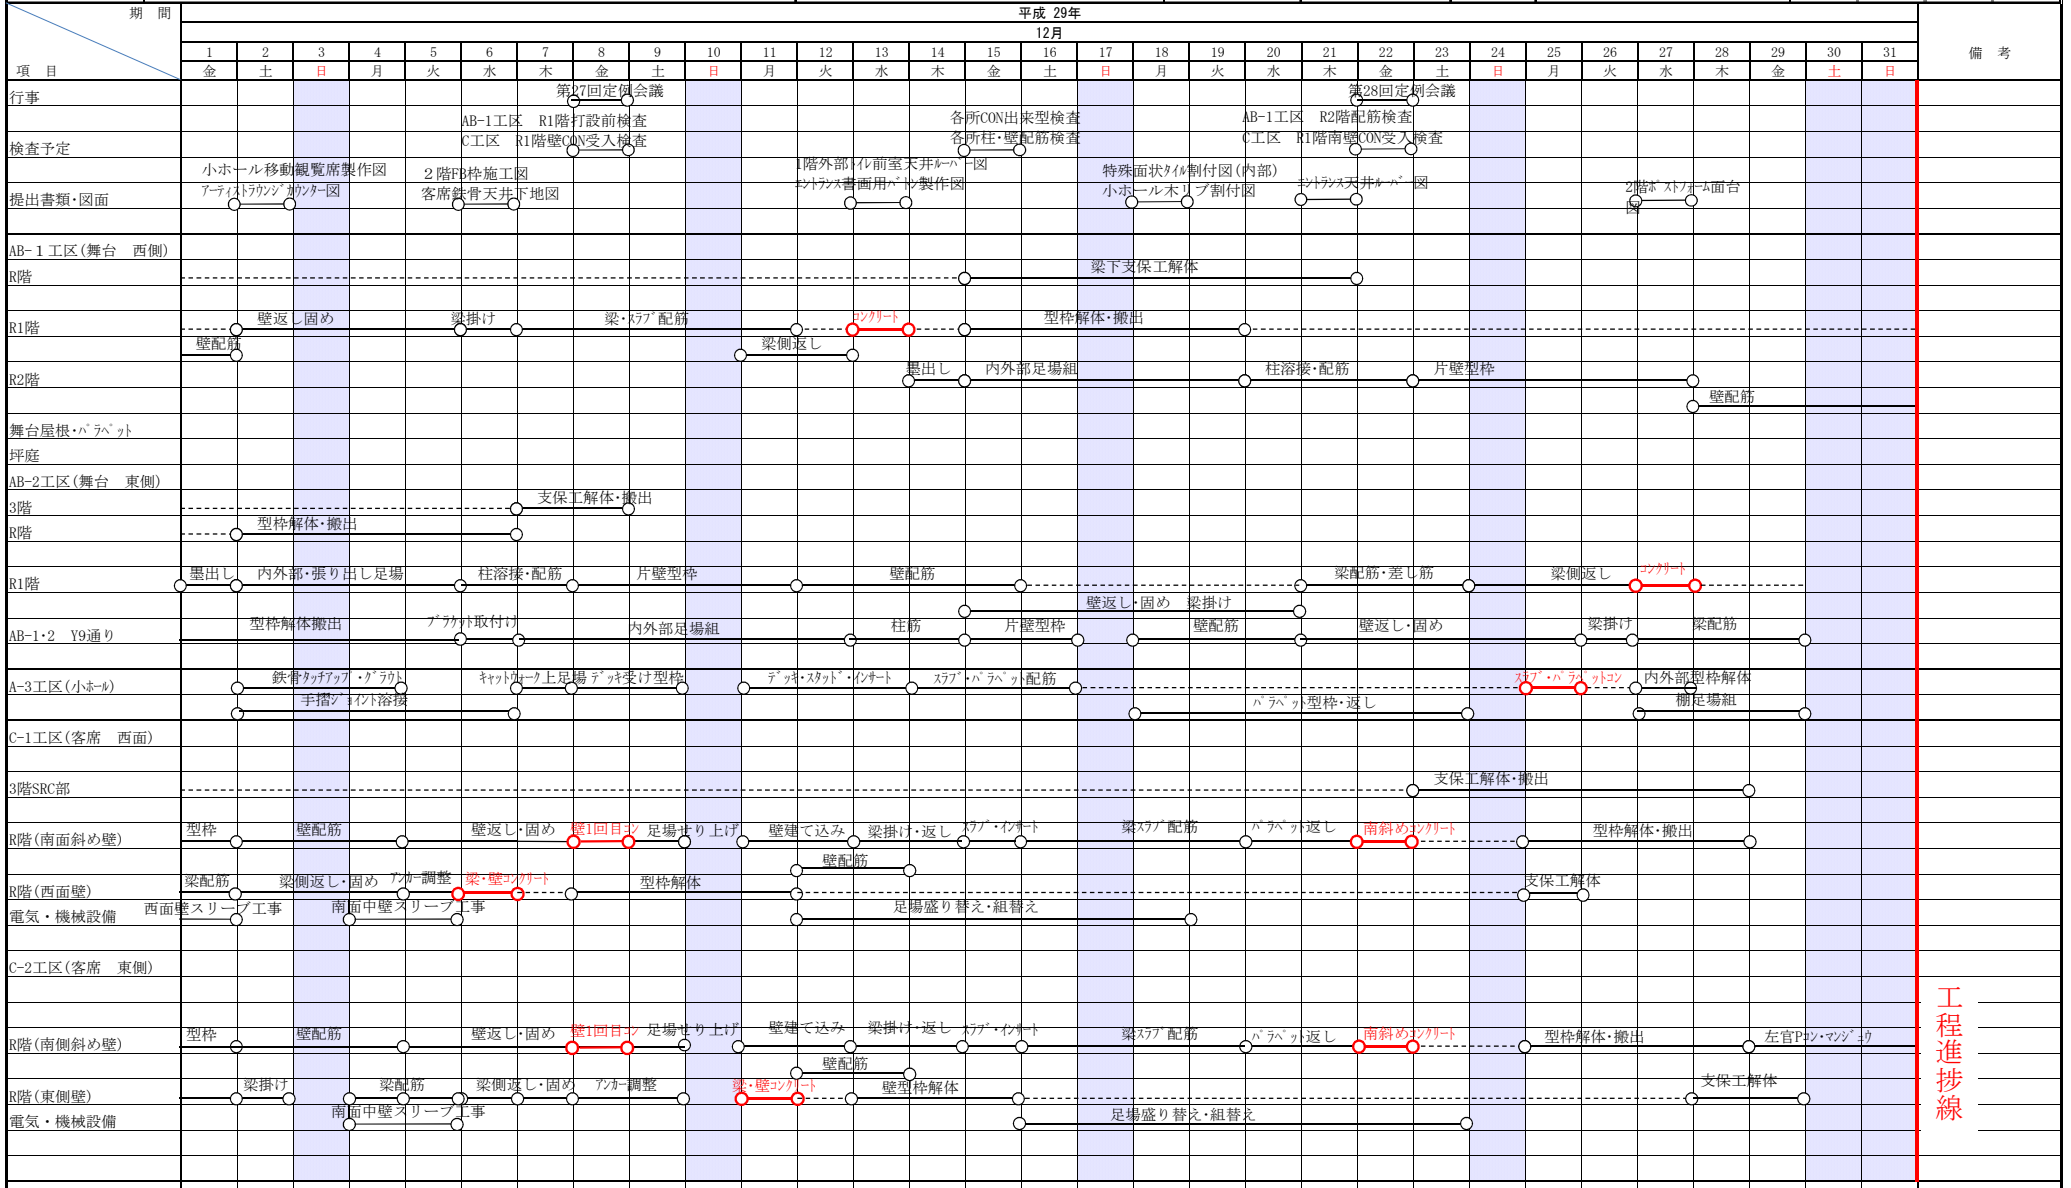

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|--|--|----------------------------|-----------------------|
| 特記事項 (行事予定等) | | | 天皇誕生日 | | | 実施出来高 24.00 予定出来高 20.20 | 工程進捗抄線 コンクリート打設実施線 |
|-----------------|--|--|-------|--|--|----------------------------|-----------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|-----|----------------|----|----|-----|--|
| 工事名称 | (仕上げ)四国中央市 市民文化ホール新築工事 2017 | 内・外装工事 12月 月間工程表 | 発注者 | 四国中央市 市長 篠原 実 | | | 所長 | 副所 | 副所 | |
| 工 期 | 平成 28年 9月 7日 ~ 平成 31年 5月 31日 | | 施工者 | 株式会社 熊谷組 中四国支店 | | | 下川 | 西田 | 正法地 | |
| 設 計 者 | 株式会社 あい設計 | | 作成者 | 正法地 | 作成日 | 平成 29年 11月 20日 | | | | |

| 期 間 | 平成 29年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備 考 | |
|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | |
| 検査予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外装仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西・北面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陸屋根5 外壁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内装仕上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荷捌き | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACMR1前室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACMR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 楽屋エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舞台倉庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピアノ楽器庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階段3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部トイレ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会議室エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トンナピット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小ホール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多目的室・調整室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営事務室 (ト化含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廊下・階段1・2エリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階トイレ(西側) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACMR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 (行事予定等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工程進捗線
