| 工事名称 | 四国中央市市民文化ホール新築工事 | （実施・月間工程表） | 発 注 者 | 四国中央市　市長　篠原実 | 所長 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工　　期 | 平成 28年 9月 7日 ～ 平成 31年 5月 31日 | **月 間 工 程 表** | 施 工 者 | 株式会社　熊谷組　四国支店 | | | | |
| 設 計 者 | 株式会社　あい設計 | | 作 成 者 | 西田　俊郎 ／ 作成日　平成 28年 11月 24日 | | | | |

期間：平成 28年　11月 1日（火）～ 12月 31日（土）　／　項目　／　備考

## 事務所仮設工事

- 仮設事務所設置
- 仮設事務所備品納入
- 仮設電気
- 仮設水道接続
- 電話工事(敷地内)
- 電話工事(敷地外)

## 上下水道引込み工事

- 上下水道申請書類提出
- 給水管・下水道管引込み

## 調査・挨拶

- 近隣家屋調査(6軒)
- 近隣説明会　近隣挨拶

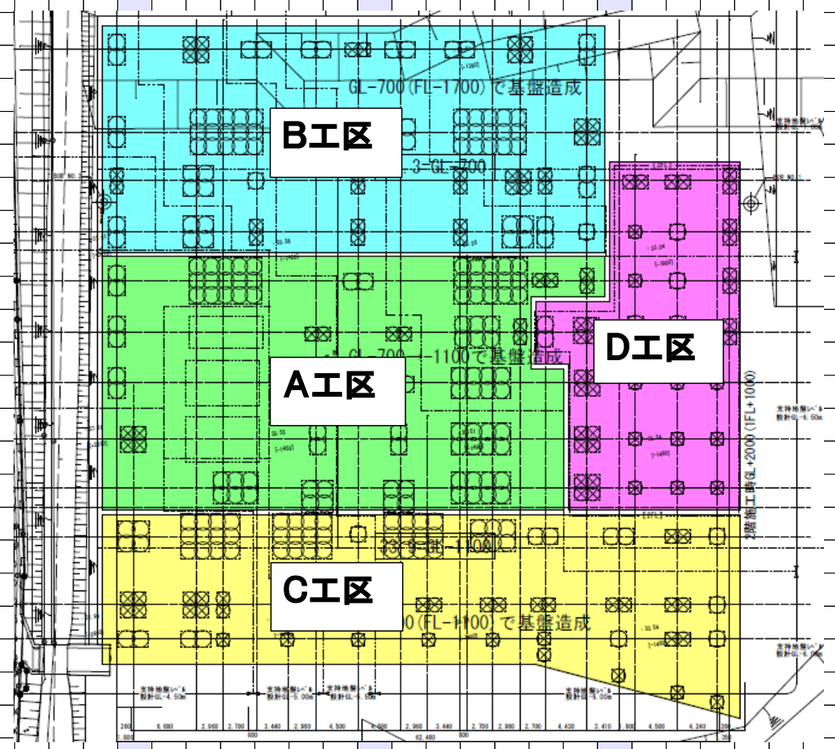


## 仮設工事

- 敷地仮囲い盛替え（西面）・南面仮囲い変更
- 敷地仮囲い盛替え予定（北面）　予定中止

## 仮設準備工事（仮設土工事）

- 草刈り・地盤改良工事 施工盤準備（堤切土・施工盤盛土・通路整備）
- 施工盤準備測量
- 敷地境界測量
- ゲート部仮設工事・2階地盤改良盤整備

## 地盤改良工事

- 配合試験・六価ｸﾛﾑ溶出試験用 現状土ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
- 試験体作成
- 配合試験体養生期間
- ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量確定（1/11より工事開始予定）

## 施工図等 書類

- 安全衛生管理計画書　提出
- 地盤改良工事施工計画書　提出
- 総合施工計画書　提出
- 地盤改良伏せ図提出
- ２重ピット基礎伏せ図提出
- 敷地測量重ね図提出
- 1階基礎伏せ図提出
- 2階基礎伏せ図提出

## 立会・検査等

- 建物位置確認
- 地盤改良芯確認（1/10予定）

## その他

## 特記事項（行事予定等）

- 文化の日
- 第1回総合定例会議
- 近隣説明会
- 勤労感謝の日
- 第2回総合定例会議
- 第3回定例会議
- 第4回総合定例会議
- 天皇誕生日
