工事名称	四国中央市市民文化ホール新築工事	（１月実績）	発 注 者	四国中央市　市長　篠原実	所長			
工　　期	平成 28年 9月 7日 ～ 平成 31年 5月 31日	月 間 工 程 表	施 工 者	株式会社　熊谷組　四国支店				
設 計 者	株式会社　あい設計		作 成 者	西田　俊郎　作成日　平成 28年 12月 14日				

期間 ／ 項目

平成 29年 1月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

備考

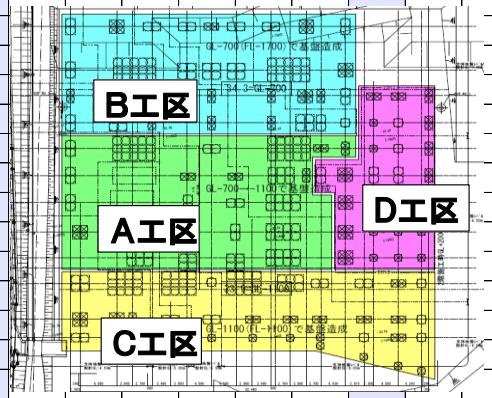

仮設工事
- 北側施工盤整備
- 設備仮設事務所設置

Ｂ工区基礎工事

Ａ工区基礎工事
- Ａ工区２重ピット部掘削・床付

地盤改良工事(2F部)
- D工区地盤改良盤整備

地盤改良工事(1F部)
- ｾﾒﾝﾄ系固化材配合量確定
- 地盤改良芯測量
- 掘削機等搬入組立
- 地盤改良工事(1F部)
- 第1回目ｺｱ採取

施工図等 書類
- 機械設備施工計画書
- 電気設備施工計画書
- スリーブ施工要領書
- 基礎スリーブ図
- 提出
- 鉄骨製作要領書提出
- 鉄筋工事施工計画書提出
- 鉄骨溶接部 外観・超音波探傷検査要領書提出
- 型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 施工計画書提出
- ＣＢ溶接施工要領書提出
- SRC部鉄骨製作図提出
- ｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書提出
- 鉄筋材料受入立会 2/14に変更

立会・検査等
- 土工事施工計画書提出
- 地盤改良芯確認立会
- 試験掘削立会
- ｺｱ採取立会

その他
- 改良芯確認検査

特記事項（行事予定等）
- 元旦
- 振替休日
- 第５回定例会議
- 四国中央市 管内視察
- 第６回総合定例会議
